



**ÍNDICE**

<b>1. PLAN DE OBRA .....</b>	<b>2</b>
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES .....	2
1.2. TAREAS AGRUPADAS .....	2
1.3. DIAGRAMA DE BARRAS O DE GANTT.....	2



## 1. PLAN DE OBRA

### 1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

En este anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las *principales* actividades de la obra.

La Fase I que se desarrolla en el presente proyecto se engloba dentro de la actuación general de la urbanización de la Rúa Severino Cobas. El tramo que corresponde a esta fase discurre entre el entronque con la Rúa de Bagunda (P.K: 0+000) y el cruce con la Travesa de Santa Cristina (P.K. 0+300).

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la practica puede verse afectado por múltiples factores.

Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que cuente y el rendimiento de los equipos, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Dada la conflictividad del tipo de trabajo a realizar, en el que se deben ir realizando las excavaciones, junto con la colocación de todas las canalizaciones de servicios para luego dar paso al tráfico sobre esa zona y poder ejecutar la zona de la actual calzada, los rendimientos no es posible analizarlos en función de las unidades a ejecutar de cada tipo, ya que no se pueden ejecutar de una forma continuada.

### 1.2. TAREAS AGRUPADAS

Consideramos por lo tanto el agrupamiento de tareas homogéneas para cada uno de los frentes de trabajo, que engloban diferentes unidades básicas.

Como tareas agrupadas se han considerado las siguientes:

- ◆ Excavaciones y rellenos zonas ampliación
- ◆ Muros de contención
- ◆ Servicios zonas ampliación
- ◆ Afirmando provisional (subbases)

- ◆ Desvío de tráfico zona nueva
- ◆ Demolición calzada existente
- ◆ Servicios bajo calzada
- ◆ Extendido de subbases
- ◆ Extendido de capas de aglomerado
- ◆ Señalización


### 1.3. DIAGRAMA DE BARRAS O DE GANTT.

A continuación se describe en un cronograma de barras – Diagrama de Gantt la previsión orientativa de ejecución de cada una de las actividades indicadas.

Los rendimientos conseguidos dependen directamente de los medios empleados, con un límite impuesto físicamente por la interferencia entre ellos en el espacio reducido.

El plazo final previsto para la realización de los trabajos es de tres meses.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA RUA SEVERINO COBAS. PARROQUIA DE LAVADORES. VIGO

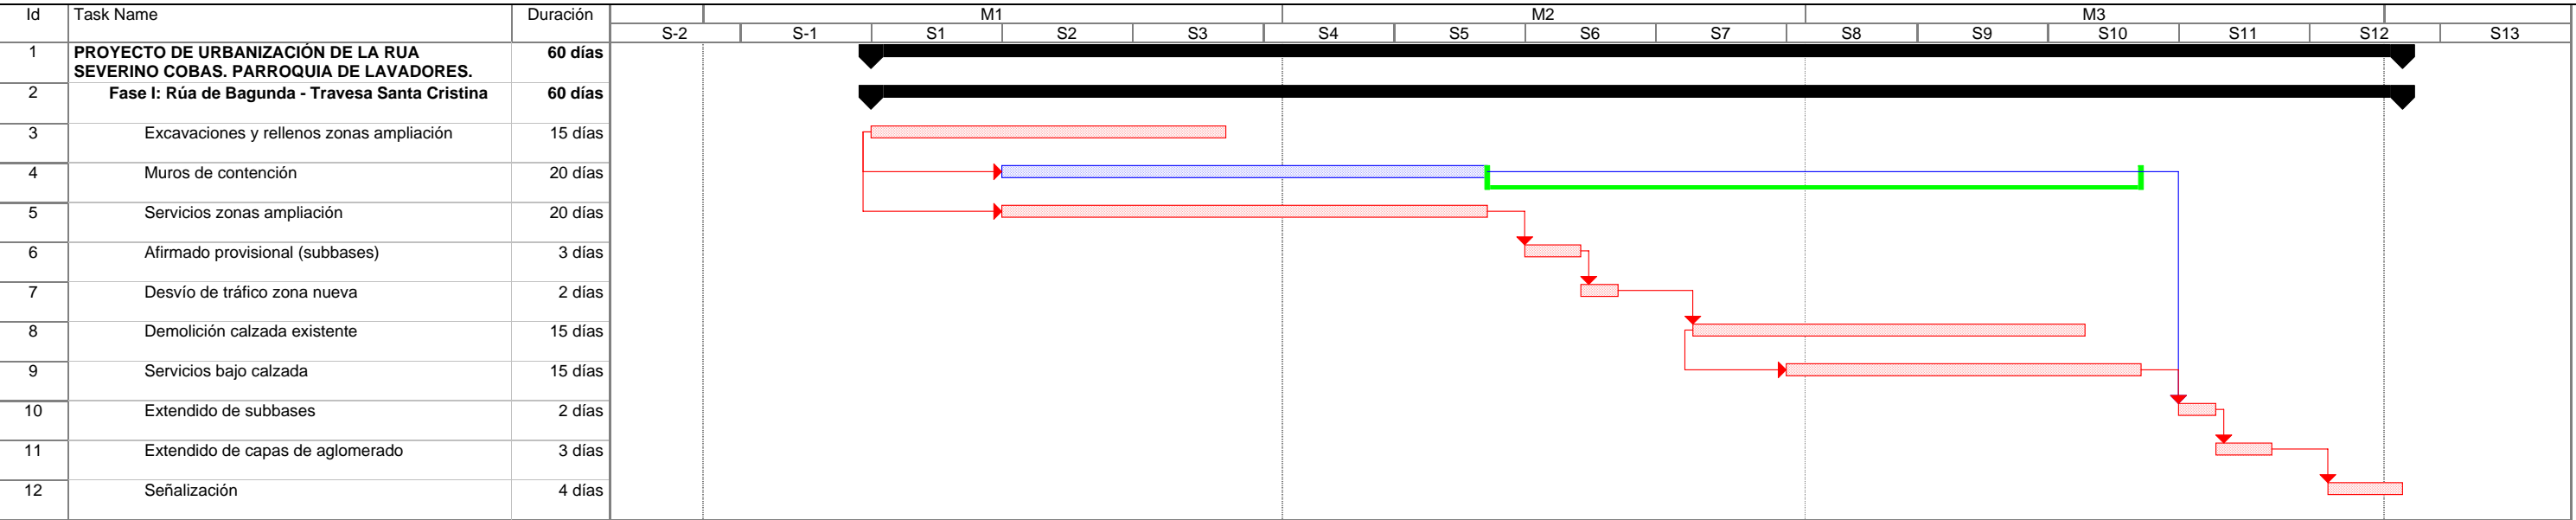

Critical

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

DEMORA

↓

L
